INFORME DE EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FNDR
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

1.- DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Programa: "Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0.

- Ejecutor: Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).
- Encargado Proyecto: Guillermo Peña Pool
- Fecha informe: 30/04/2026

2.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROGRAMA

El “Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0, permitirá abordar en forma sistémica distintas problemáticas que afectan a las Mipes y emprendimientos de Atacama. Por una parte, el programa dispondrá de recursos directos para que las empresas Mipes puedan concretar inversiones para poder mejorar sus actuales condiciones o recuperarse de la fuerte crisis. Del mismo modo el programa contempla si fuera necesario recursos para asesoría técnica y capacitación para que los/as beneficiarios/as puedan mejorar la gestión de su negocio, así estos podrán ver mejorada su competitividad o lograr superar la fuerte crisis a la que se ven afectados, mediante la incorporación de tecnologías en sus procesos productivos y la incorporación de mayor conocimiento para la gestión de los negocios. El programa, contempla un postulación flexible y simple, además, de la elaboración de un plan de inversiones, lo que contribuye a que las empresas, planteen y reflexionen de mejor modo la programación de las inversiones en el tiempo, contribuyendo en forma directa a mejorar la planificación y con ello la gestión de recursos externos que puedan obtener para ser apoyados en su desarrollo y crecimiento todo esto de una manera simple y de rápida elaboración

Objetivos General del programa

Contribuir a mejorar el nivel de competitividad y creación de empresas de oportunidad y acceso a canales de comercialización de mipes y emprendedores/as de Atacama, buscando que Micro y pequeñas empresas y potenciales negocios de Atacama que son atendidas por el programa, se formalizan, mantienen y se desarrollan y aumentan sus ventas mediante la incorporación capital para nuevas inversiones y/o acciones de gestión empresarial en beneficio de sus negocios.

Objetivos específicos:

- Promover la creación de al menos 270 nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y formulación de un plan de trabajo para implementar un negocio, en un periodo de 2 años.

- Fortalecer el crecimiento de al menos 90 Almacenes de la región en un plazo de 2 años a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

- Fortalecer la gestión de al menos 120 empresas micro y pequeñas de la región con la finalidad de potenciar su crecimiento o su acceso a nuevas oportunidades de negocio en un periodo de 2 años.

- Apoyar la participación de al menos 360 micro y pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización, con el objeto de facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocios sostenidas en el tiempo, en un periodo de 2 años

Componentes

Componente	Descripción
Capital semilla y abeja Total 270 beneficiarias/os	Capital Semilla Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. (120) Capital Abeja Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado. (150)
Programa Crece para micro y pequeñas empresas Total 120 Beneficiarias/os	Potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoyar la implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing) para el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones. (60 Crece Abeja y 60 crece multisectorial)
Promoción y canales de comercialización. Total 360 beneficiarias/os	Sercotec financiará tanto la ejecución de las ferias y/o eventos, presenciales o virtuales, que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeños empresarios de la región, como la realización de otras herramientas de comercialización, el monto del subsidio dependerá de cada actividad, Las actividades son financiadas en un 100% por Sercotec, siendo de carácter gratuito para los beneficiarios/as. (360)

Digitaliza tu Almacén Total 90 beneficiarias/os	Fortalecer el crecimiento de Almacenes de la región a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio (90)

3.- INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS/ COMPONENTES OBTENIDOS

Actividades realizadas o en ejecución en el período

Durante el período comprendido entre el **01 y el 30 de abril de 2026**, se realizaron las siguientes actividades:

Detalle de actividades:

3.1 . – CAPITAL EMPRENDE (ABEJA Y SEMILLA)

El programa Abeja, ejecutado por SERCOTEC y financiado con recursos FNDR, está orientado a apoyar el crecimiento de micro y pequeñas empresas y proyecta beneficiar a 33 empresas. Con posterioridad al cierre de la postulación, los postulantes avanzan progresivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, test de preselección, evaluación técnica del proyecto de negocio y del video pitch, evaluación en terreno y revisión y sanción por parte del Comité de Evaluación Regional, tras lo cual los seleccionados continúan a la etapa de formalización.

Nombre proyecto	Capital Abeja FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400716
Beneficiarias/os	33
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	149.065.529
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	Formalización

El programa Semilla, ejecutado por SERCOTEC y financiado con recursos FNDR, está orientado a apoyar el crecimiento de micro y pequeñas empresas y proyecta beneficiar a 27 empresas. Con posterioridad al cierre de la postulación, los postulantes avanzan progresivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, test de preselección, evaluación técnica del proyecto de negocio y del video pitch, evaluación en terreno y revisión y sanción por parte del Comité de Evaluación Regional, tras lo cual los seleccionados continúan a la etapa de formalización.

Nombre proyecto	Capital Abeja FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400715

Beneficiarias/os	27
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	121.242.236
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	Formalización

Actividades realizadas:

- Estudio de material oficial de los programas para dar comienzo a la etapa de formalización, "Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama"
- Revisión verificadores postulantes Capital Semilla.
- Revisión presentaciones CER postulantes Capital Semilla.
- Realización CER Capital Semilla Emprende FNDR.
- Obtención de las Notas de Corte de Selección en ambos programas -Abeja y Semilla- Emprende 2025 y elaboración de listado de postulantes seleccionados
- Reuniones de inicio de etapa de formalización de programas Abeja y Semilla
- Gestionar avance a etapa de formalización en ambos programas.
- Generación y revisión de la muestra de formalización de programas Abeja y Semilla.
- Notificación avance de lista de espera Capital Abeja de postulantes María Ulloa y Camila Aros.

- Confección de informe mensual GORE – SERCOTEC, e informe personal de desempeño como profesional de apoyo.
- Listado de postulantes seleccionados de los programas Abeja y Semilla.

Quedando de la siguiente manera la distribución regional de ambos fondos:

Capital Abeja Emprende FNDR 2025


Comuna	Cantidad
Copiapó	17
Diego de Almagro	6
Caldera	3
Freirina	1
Alto del Carmen	2
Huasco	2
Chañaral	1
Vallenar	1
Total	**33**

Capital Semilla Emprende FNDR 2025

Comuna	Cantidad

Copiapó	12
Vallenar	7
Freirina	2
Caldera	2
Alto del Carmen	1
Diego de Almagro	1
Huasco	1
Tierra Amarilla	1
Total	**27**

Se adjunta imagen y actas de las reuniones realizadas durante el periodo, la cual incluye tanto las reuniones semanales con el AOS, como los CER para el programa Semilla, reuniones de inicio de la etapa de formalización de los programas Abeja y Semilla y reuniones de equipo de la Dirección Regional.

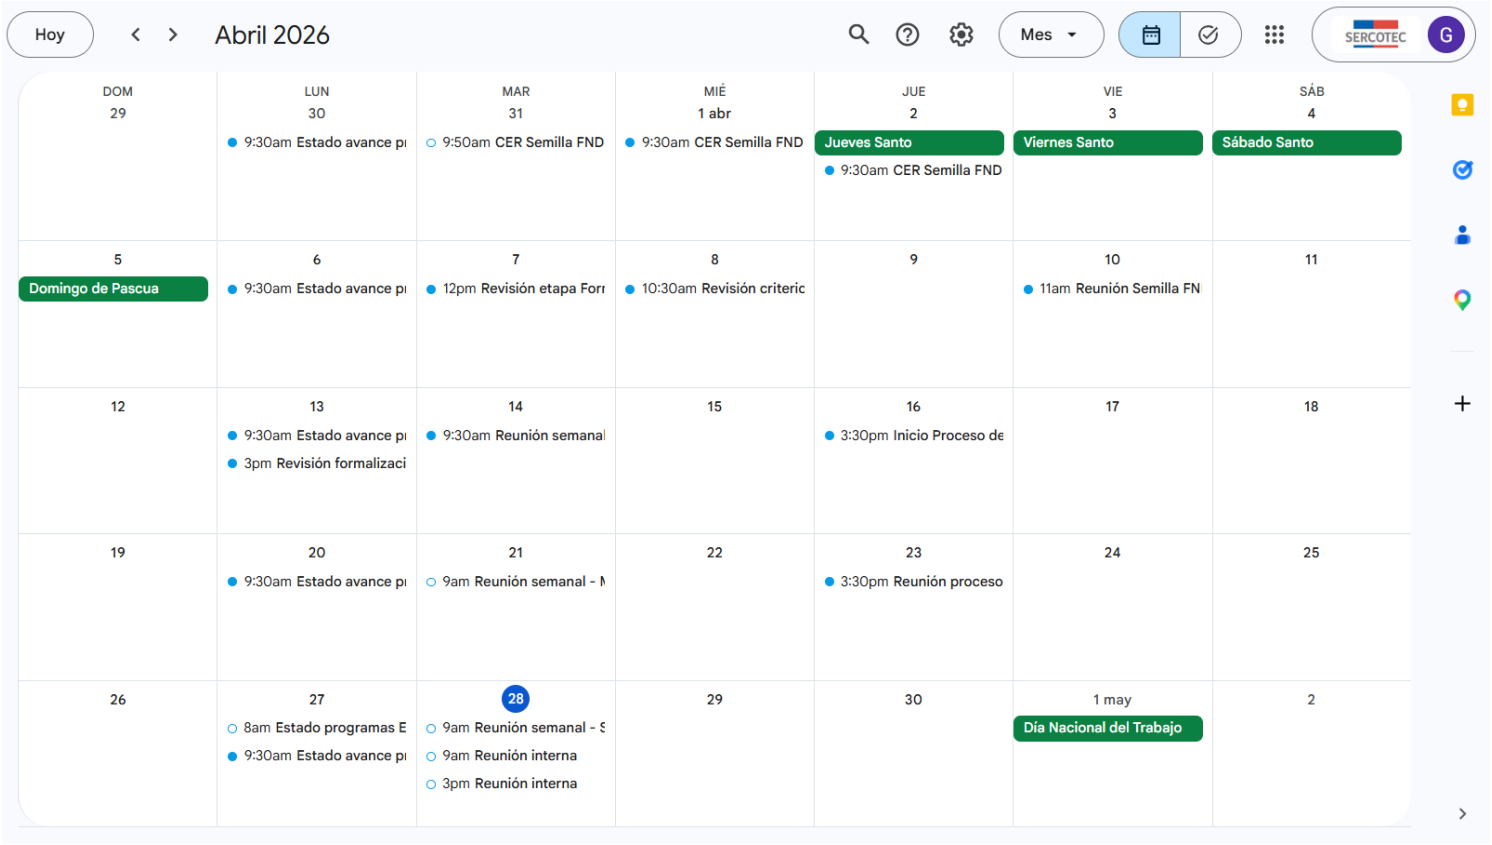

Aspectos financieros

- Resumen gasto programa Abeja FNDR Ecosistema emprendedor

Items		Cobertura	Valor Unitario $	Cofinanciamiento Sercotec Inicial	Transferido dic-2025	Transferido abril 2026	Saldos
Costos Operacionales	Inversiones	33	$3.300.000	$108.900.000	$108.900.000	$108.900.000	$0
	Acciones de Gestión Empresarial	33	$200.000	$6.600.000	$6.600.000	$6.600.000	$0
	Acciones de Difusión			$945.378	$945.378	$945.378	$0
	Formulación Plan de Trabajo	33	$230.000	$7.590.000	$7.590.000	$7.590.000	$0
	Formalización y Asistencia Técnica del Plan	33	$520.000	$17.160.000	$17.160.000	$17.160.000	$0
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES			**$141.195.378**	**$141.195.378**	**$141.195.378**	**$0**
Costos Administrativos	Evaluación técnica (1:2,5)	87,00	$15.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$0
	Evaluación terreno (1:1,5)	53,00	$33.500	$2.010.000	$2.010.000	$1.775.500	$234.500
	Seguimiento Financiero	33	$130.000	$4.290.000	$4.290.000	$4.290.000	$0
	Costos de Administración de Recursos Transferidos y Fiel Cumplimiento			$2.823.908	$1.696.681	$1.696.681	$1.127.227
	TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS			**$10.428.908**	**$9.301.681**	**$9.067.181**	**$1.361.727**
TOTAL CONVOCATORIA				**$151.624.286**	**$150.497.059**	**$150.262.559**	**$1.361.727**

Se gestionó la devolución por concepto de una menor cantidad de evaluaciones en terreno (53).
En el caso de la garantía de GO solo fue transferido el neto.

- Resumen gasto programa Semilla FNDR Ecosistema Emprendedor

Items		Cobertura	Valor Unitario $	Total	Transferido abr-26	Saldos
Costos Operacionales	Inversiones	27	$3.300.000	$89.100.000	$89.100.000	$0
	Acciones de Gestión Empresarial	27	$200.000	$5.400.000	$5.400.000	$0
	Acciones de Difusión	1	$945.378	$945.378	$945.378	$0
	Formulación Plan de Trabajo	27	$230.000	$6.210.000	$6.210.000	$0
	Formalización y Asistencia Técnica del Plan	27	$520.000	$14.040.000	$14.040.000	$0
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES			**$115.695.378**	**$115.695.378**	**$0**
Costos	Evaluación técnica	68	$15.000	$1.200.000	$1.020.000	$180.000

Administrativos	Evaluación terreno	52	$33.500	$1.742.000	$1.742.000	$0
	Seguimiento Financiero	27	$130.000	$3.510.000	$3.510.000	$0
	Garantía			$1.615.442	$1.615.442	$0
	TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS			**$8.067.442**	**$7.887.442**	**$180.000**
TOTAL CONVOCATORIA				**$123.762.820**	**$123.582.820**	**$180.000**

Se gestionó la devolución por concepto de una menor cantidad de evaluaciones técnicas (68).

4.- ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Principales dificultades encontradas

- No se presentaron dificultades en el periodo.

Resultados/ componentes obtenidos en el periodo

- Finalización etapa CER Capital Semilla NFDR.
- Inicio etapa de formalización programa Abeja FNDR Ecosistema, en proceso. 4 seleccionadas solicitaron ampliación de plazo de entrega de verificadores.
- Inicio Etapa de formalización programa Semilla FNDR Ecosistema Emprendedor.

Valoración de la organización y gestión del proyecto

Se identificaron las siguientes fortalezas en el proceso:

- Coordinación interna entre los profesionales de Sercotec para la ejecución de reuniones con el AOS, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las distintas etapas de cada programa.

- Trabajo en equipo por parte de ejecutivos y ejecutivas de Fomento Sercotec y el equipo FNDR para el lanzamiento de las etapas de formalización de programas Abeja y Semilla.

Recomendaciones y sugerencias sobre la organización y gestión

- Mantener las reuniones semanales del equipo FNDR con el AOS.
- Generar reuniones semanales entre Profesionales de Apoyo y contraparte de AOS.

5.- ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Sin movimiento a la fecha.

Comentarios a las desviaciones respecto al presupuesto inicial

No hay

Recomendaciones y sugerencias sobre el presupuesto

No hay.

Guillermo Peña Pool
Profesional De Apoyo
RUT: 17085800-K
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 30 de abril del 2026 a las 13:26 Hrs.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Guillermo Peña Pool
Profesional de Apoyo
Sercotec Atacama

Anexos Capital Abeja y Capital Semilla FNDR

Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	06-04-2026
Lugar/modalidad	Online – Google Meet
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA
Profesional Sercotec asistentes	Mario Zanoni – Guillermo Peña – Andrea Toro – Lissette Alfaro – Matías Aguirre – Marcelo Quiroga – Benito Maya
Profesional AOS asistentes	Sergio Villca, Angélica Rojas, Johan Olavarría, María José Allende
Motivo (Marcar con X)	Supervisión: X; Informativa: ; Capacitación: ; Control AOS: X; Otra:

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Estado de avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor v.2025 (Capital Abeja Emprende, Capital Semilla Emprende, Digitaliza Tu Almacén y Crece Multisectorial) y además un tema de promoción

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*

Se detallaron estado de avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor:

- **Crece Multisectorial**: Se reportó un aumento significativo en la presentación de documentos por parte de los beneficiarios durante el fin de semana, recibiendo muchos correos de confirmación. Se está revisando activamente la documentación, observando y notificando errores en la plataforma para que los participantes puedan corregir los problemas. Es imperativo contactar a cualquier persona que aún no haya enviado documentos, ya que el plazo vence el miércoles sin posibilidad de prórroga. Se comentó por parte del AOS problemas con la página de TGR para la verificación del certificado de deuda fiscal, por lo tanto, se indicó al AOS a que llamara a la Tesorería para preguntar sobre el problema del sistema y su posible solución.

  Se comentaron, además, ámbitos sobre la plataforma de sistema de gestión de clientes, específicamente a que las solicitudes en la plataforma no están marcadas claramente por programa, lo que dificulta la revisión de los casos. Se instruyó al AOS que abordara estas observaciones directamente con las contrapartes de nivel central que están a cargo del monitoreo de la plataforma, y a documentar ejemplos con capturas de pantalla para facilitar la retroalimentación

  Finalmente, se acordó que la comunicación a los 26 beneficiarios sobre el vencimiento del plazo el miércoles debe realizarse a través de la plataforma en lugar de un correo electrónico general y se recordó al AOS que los usuarios deben cargar también el Anexo 3 y el Anexo 4 como medio de verificación a través de la plataforma.

  Sobre los casos de ampliación de plazo, se revisará con Constanza el procedimiento correcto para solicitar la ampliación de plazo, y a quién debe dirigirse la carta de solicitud, ya que esta información es nueva y podría ser utilizada por todos los participantes si se hace pública.

  Andrea informó a Angelica que la rendición de gastos de febrero para el Crece Especial fue observada financieramente debido a un error en la fecha de la factura en el SISREC. Se instruyó a corregir el error antes de mañana, ya que el gasto sería rechazado si la observación no se subsana, y se indicó que debía ingresar la observación sobre el problema con la fecha en el sistema. Se aclaró que las fechas no se compatibilizan ya que la garantía de fiel cumplimiento se solicita previo a la firma de convenio.

- **Digitaliza Tu Almacén**: Se confirmó que los profesionales ya han sido asignados a los seleccionados del programa y que se les ha enviado la notificación por la plataforma. La capacitación para los seleccionados sobre formalización y uso de la plataforma se llevará a cabo a las 11:00 am, y tienen plazo hasta el 10 de abril para entregar la documentación requerida.
  Se perciben posibles dificultades de uso debido al perfil del usuario, que se espera sea mayor y con menos facilidad tecnológica. Se constató que la plataforma estuvo caída hasta el jueves por la tarde, por lo que los participantes de Almacenes recién podrán comenzar a revisar el sistema el día de la reunión.
  Se confirmó que 15 personas han confirmado su asistencia a la reunión en línea, y que el mayor desafío para los usuarios es obtener documentos como el F30, F30-1 y el certificado TGR, más que subir los documentos. Se reforzó que los usuarios con dudas pueden contactar o asistir al Punto MIPE, y se solicitó que participen en la reunión de capacitación de las 11:00 am para brindar apoyo a los beneficiarios.


- **Capital Abeja y Capital Semilla**: Matías informó que esperan tener a los seleccionados del programa Abeja entre hoy y mañana, lo que iniciará la etapa de formalización, y se coordinará una reunión con María José para explicar los verificadores y plazos. Para el programa Semilla, Lissette sugirió revisar las notas con Guillermo para tener resultados el miércoles y poder notificar a los beneficiarios esta semana. Se confirmó que ni Semilla ni Abeja utilizarán la plataforma y el proceso será por correo electrónico.
  Sobre los casos particulares en Abeja y Semilla (como postulaciones de familiares en dos programas), se consultará con el Gerente de Desarrollo Empresarial para analizar y dictaminar los casos. Se solicitó un texto de apoyo para enviar por correo para que la gerencia pueda tomar una decisión, con el fin de agilizar la resolución.

- **Promoción**: Lissette confirmó que la ampliación del convenio de promoción ha sido visada y la enviará para la firma digital de Sergio, lo que permitirá la apertura de SISREC para la rendición de abril.

Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*

- Se comentará con las contrapartes de la plataforma sobre oportunidades de mejora y consultas de ampliación de plazo para el caso del Crece
- Se realizará capacitación a seleccionados de digitaliza tu almacén para la etapa de formalización para hoy a las 11:00 hrs.
- Se redactará un correo al Gerente de Desarrollo Empresarial para abordar y decidir sobre los casos de Semilla y Abeja presentados en CER.
- AOS se contactará con la atención de TGR para resolver la verificación del certificado de deuda tributaria.
- Existe un gasto observado en la rendición del Crece Especial, por lo que se pidió resolver el tema de las fechas agregando la observación asociada a los plazos de solicitud de emisión de la garantía de fiel cumplimiento

Anexo. Verificadores de reunión

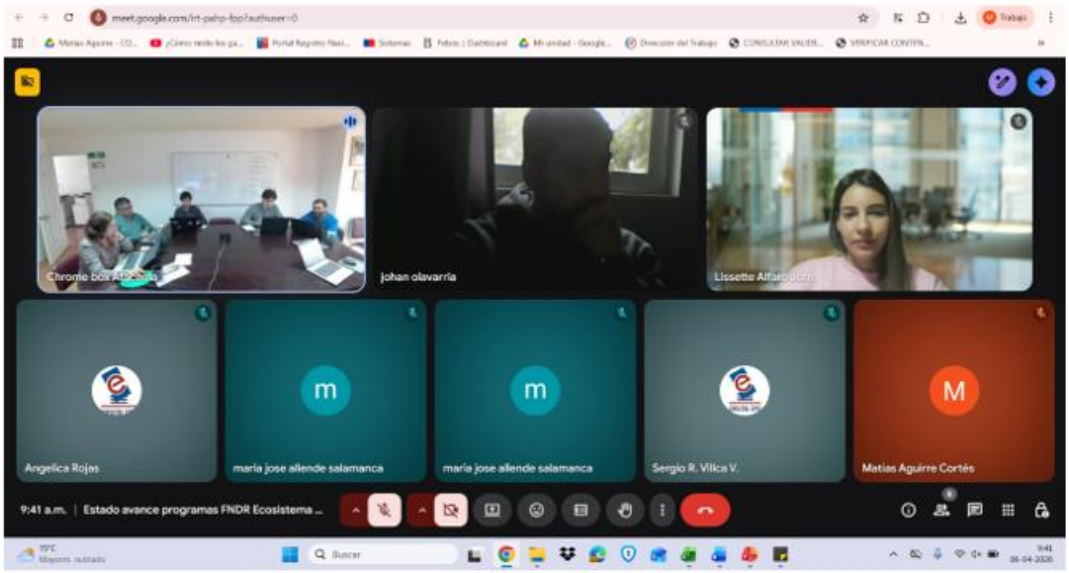

Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	07-04-2026								
Lugar/modalidad	Online – Google Meet								
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor								
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA								
Profesional Sercotec asistentes	Guillermo Peña –Lissette Alfaro – Matías Aguirre								
Profesional AOS asistentes	María José Allende								
Motivo (Marcar con X)	Supervisión	X	Informativa		Capacitación		Control AOS	X	
	Otra:								

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Revisión proceso de Formalización programas Emprende FNDR Ecosistema Emprendedor v.2025

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*

- Previo a la revisión del proceso en tabla, los profesionales de Sercotec indicaron que se encontraron diferencias en algunos postulantes de ambos programas respecto al criterio de evaluación de terreno de si el negocio es un servicio conlleva manufactura, lo cual se quedó en la revisión en detalle de estos casos para definir las notas finales.
- Además, se tiene una duda con un postulante que al parecer vive entre Huasco y Freirina, lo cual el AOS dará más detalles para definir su nota en el criterio de comunas priorizadas.
- Se indicó al AOS que el proceso de formalización comienza después de la selección de postulantes, la cual se basa en el presupuesto regional. Una vez que se genera la notificación, AOS tiene 24 horas para contactar a las personas seleccionadas, entregarles los verificadores necesarios y documentos que deben completar y enviar en un plazo máximo de 10 días administrativos. Se debe notificar a las personas seleccionadas por correo electrónico, proporcionándoles el listado de verificadores requeridos
- Luego, se detalló y revisó el apartado del anexo 1 de formalización, entre estos, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1), no tener deudas tributarias, anexos de consanguineidad, probidad y prácticas antisindicales (anexos, 3, y 4 y 5) y uno de los requisitos más importantes es la Declaración Jurada de Inicio de Actividades en primera categoría, donde es crucial que los giros estén relacionados con el rubro del negocio, ya que errores en los giros pueden causar demoras en el proceso. Alguien en Chrome box Atacama enfatizó la necesidad de orientar a los seleccionados sobre la importancia de verificar que el domicilio de la actividad esté relacionado con el lugar donde desarrollarán el proyecto y que este domicilio sea trazable y coincida con la visita realizada. En el caso de personas jurídicas (SPA o EIRL), la persona postulante seleccionada debe tener un mínimo del 51% de las acciones, y se requiere el certificado de vigencia y el estatuto actualizado.
- Se indicó que, para temas de organización de la etapa, el AOS debe revisar los verificadores dentro de los 10 días, y el plazo máximo de ampliación para la entrega de documentos es de 5 días hábiles en casos excepcionales.
- Finalmente, se comentó que la contraparte para esta etapa y siguientes, será Guillermo Peña, por lo que, a partir del inicio de esta etapa, él supervisará la correcta ejecución de esta etapa.

Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*


- AOS tiene que revisar los documentos dentro de los 10 días hábiles. Cuando vaya finalizando esta etapa inicial, se debe analizar si haya casos que requieran ampliación de plazo
- Guillermo como contraparte supervisarán la correcta ejecución de esta etapa y debe revisar como mínimo una muestra del total
- Se revisarán aquellos casos con diferencias de notas para así definir notas finales y notificar a los postulantes seleccionados en ambos programas. Así mismo del postulante de Semilla que vive en el límite entre Freirina y Huasco.


Documento: 3aa90a10-8ee4-4f63-88a1-1a5d01f1a3c5 - Fecha de generación: 2026-04-13 11:02:38
Documento: 3aa90a10-8ee4-4f63-88a1-1a5d01f1a3c5 - Fecha de generación: 2026-04-13 11:02:38

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

SERCOTEC

Anexo. Verificadores de reunión

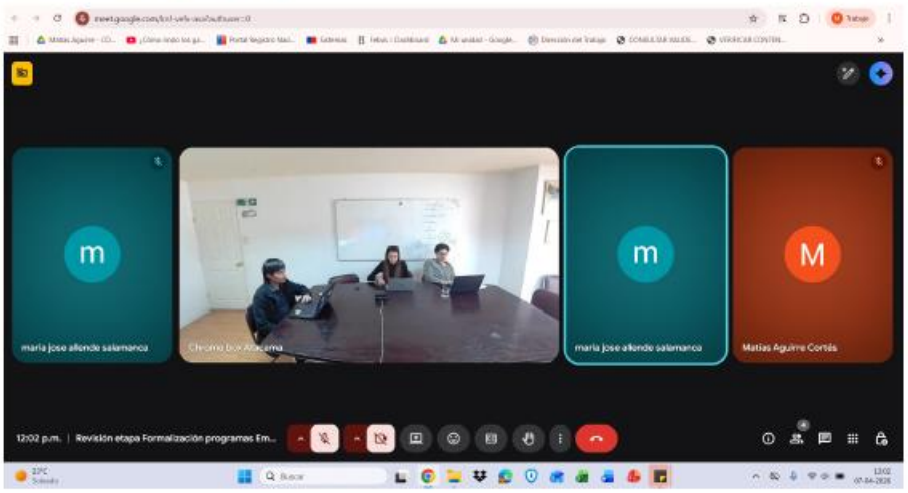

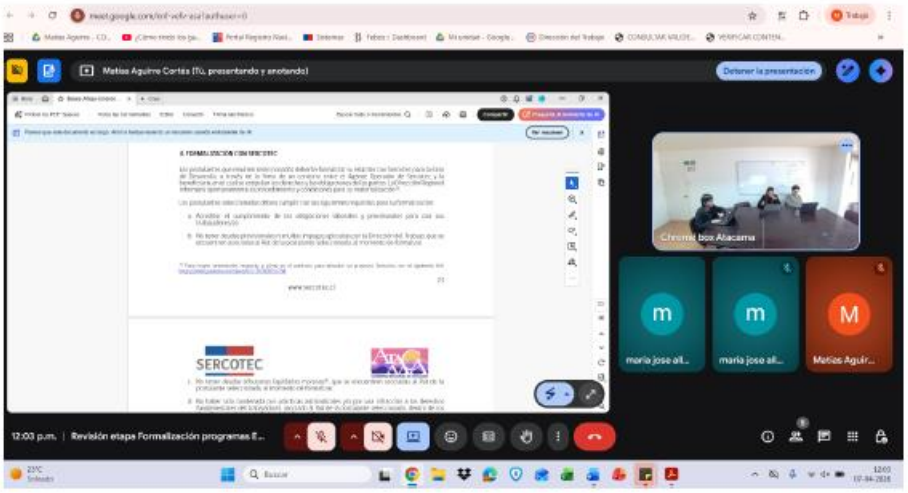

Documento: 8ada0a10-8ee9-4fa3-88af-1a6f8014f3c2 - Fecha de generación: 2028-04-29 11:03:38

Documento: 8ada0a10-8ee9-4fa3-88af-1a6f8014f3c2 - Fecha de generación: 2028-04-29 11:03:38

Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	16-04-2026
Lugar/modalidad	Online – Google Meet
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA
Profesional Sercotec asistentes	Guillermo Peña
Profesional AOS asistentes	María José Allende - Johan Olavarría
Motivo (Marcar con X)	Supervisión [ ] Informativa [ ] Capacitación [ ] Control AOS [X] [ ] **Otra:**

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Reunión Proceso de Formalización Capital Abeja Emprende FNDR v.2025.

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*


Se realizó la reunión informativa para el proceso de formalización de Capital Abeja FNDR 2025, dirigida por María José Allende. Se detallaron todos los verificadores que deben ser entregados de acuerdo con las Bases de Convocatoria y la forma de obtenerlos. Además, se contestaron dudas respecto a los verificadores y el proceso de formalización en general.

Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*

- Se estableció que la fecha límite de entrega de verificadores es el 27 de abril.

Anexo. Verificadores de reunión

Documento: e1066505-0dd5-4823-bea3-7d8340cc44f6 - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:21
Documento: e1066505-0dd5-4823-bea3-7d8340cc44f6 - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:21

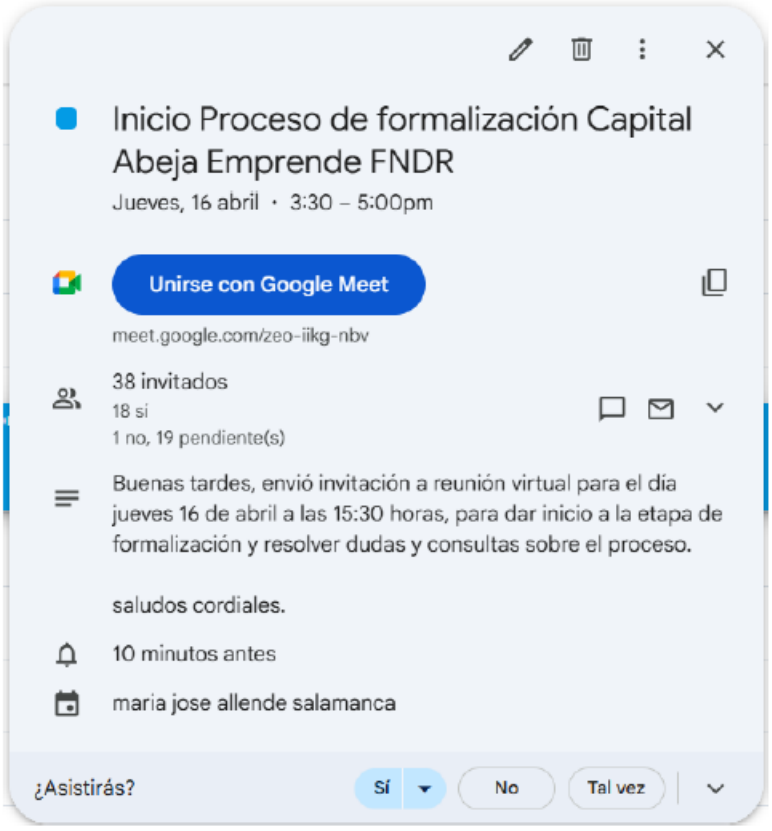

Inicio Proceso de formalización Capital Abeja Emprende FNDR

Jueves, 16 abril · 3:30 – 5:00pm

Unirse con Google Meet

meet.google.com/zeo-iikg-nbv

38 invitados
18 si
1 no, 19 pendiente(s)

Buenas tardes, envió invitación a reunión virtual para el dia jueves 16 de abril a las 15:30 horas, para dar inicio a la etapa de formalización y resolver dudas y consultas sobre el proceso.

saludos cordiales.

10 minutos antes

maria jose allende salamanca

¿Asistirás? Sí No Tal vez

Documento: e106e505-0dd5-4823-bea3-7d8340cc44f6 - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:21

Documento: e106e505-0dd5-4823-bea3-7d8340cc44f6 - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:21

Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	23-04-2026
Lugar/modalidad	Online – Google Meet
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA
Profesional Sercotec asistentes	Guillermo Peña
Profesional AOS asistentes	María José Allende - Johan Olavarría
Motivo (Marcar con X)	Supervisión [ ] Informativa [ ] Capacitación [ ] Control AOS [X] Otra:

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Reunión Proceso de Formalización Capital Semilla Emprende FNDR v.2025.

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*

Se realizó la reunión informativa para el proceso de formalización de Capital Semilla FNDR 2025, dirigida por María José Allende. Se detallaron todos los verificadores que deben ser entregados de acuerdo con las Bases de Convocatoria y la forma de obtenerlos. Además, se contestaron dudas respecto a los verificadores y el proceso de formalización en general.


Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*

- El AOS enviará por correo la presentación expuesta en la reunión a los seleccionados.
- Se estableció que la fecha límite de entrega de verificadores es el 4 de mayo.

Anexo. Verificadores de reunión

Documento: b7cb1052-414f-4bd3-9597-d74c8705991a - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:18
Documento: b7cb1052-414f-4bd3-9597-d74c8705991a - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:18

Documento: b7cb1052-414f-4bd3-9597-d74c8705991a - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:18

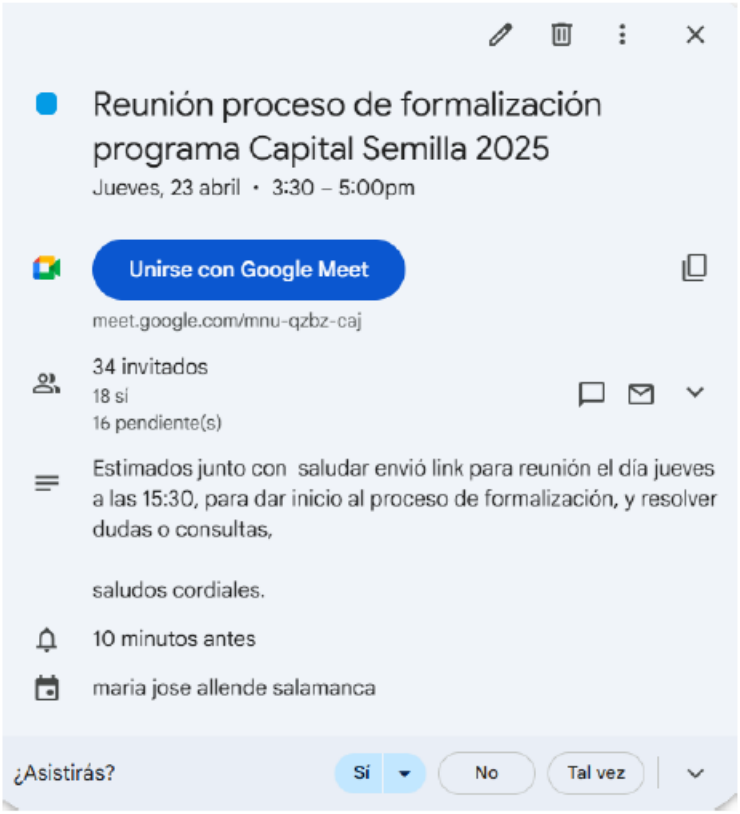

Reunión proceso de formalización programa Capital Semilla 2025

Jueves, 23 abril • 3:30 – 5:00pm

Unirse con Google Meet

meet.google.com/mnu-qzbz-caj

34 invitados
18 sí
16 pendiente(s)

Estimados junto con saludar envió link para reunión el día jueves a las 15:30, para dar inicio al proceso de formalización, y resolver dudas o consultas,

saludos cordiales.

10 minutos antes

maria jose allende salamanca

¿Asistirás? Sí No Tal vez

Documento: b7cb1052-414f-4bd3-9597-d74c8705991a - Fecha de generación: 2026-04-27 11:16:18

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!
